



# **Projeto META – Indicadores**

## **Anexo II**

## METAS PREVISTAS PARA O PROJETO


**Quadro 1 – Metas Semestrais por Coexecutor**

Meta/Indicador de Desempenho por Coexecutor						
Coexecutor	1/2015	2/2015	1/2016	1/2016*	2/2016*	1/2017*
MME	26%	41%	71%	37%	61%	100%
Cepel	55%	83%	93%	79%	91%	91%
ANEEL	14%	44%	100%	100%	100%	100%
ONS	15%	53%	100%	15%	15%	20%
CPRM	15%	77%	100%	39%	43%	100%
EPE	43%	69%	100%	39%	56%	100%

Indicador de Desempenho do Projeto						
Projeto META	43%	71%	91%	60%	71%	83%

\* Metas atualizadas após a 1ª prorrogação do Projeto META.

**Gráfico 1 – Evolução das Metas Semestrais por Coexecutor**

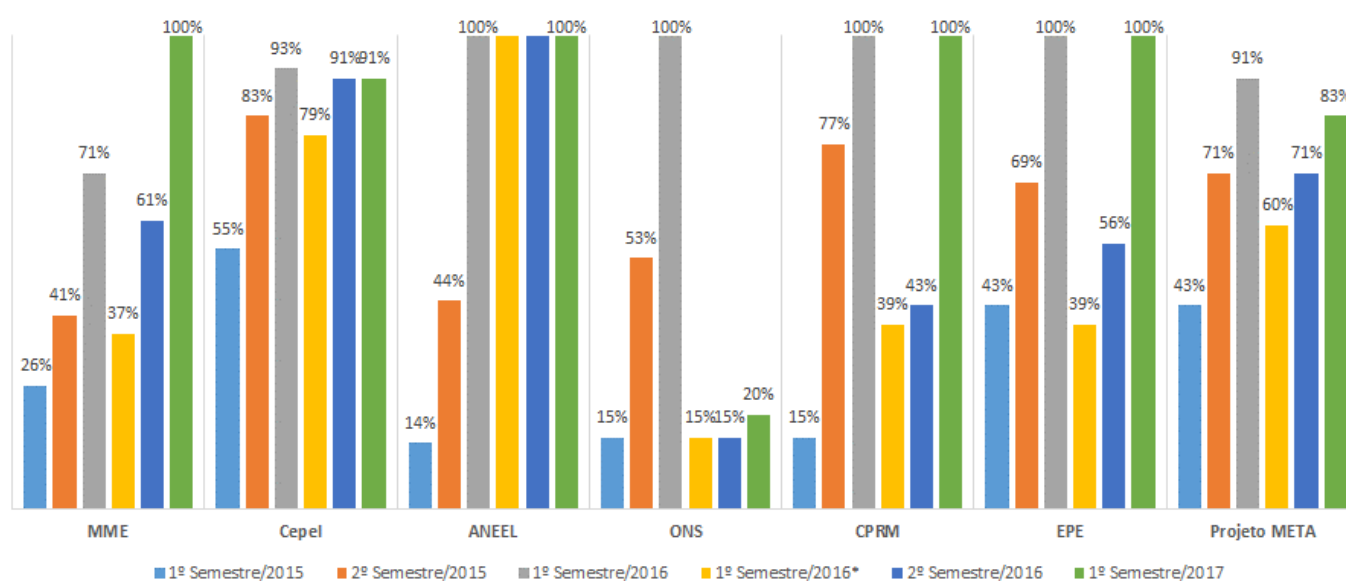

\* Metas atualizadas após a 1ª prorrogação do Projeto META.

# METAS PARA O 1º SEMESTRE DE 2015

**Quadro 2 – Metas para as atividades, subprojetos e MME – 1/2015**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2015		Avanço de valor 1/2015		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
GM	Minerogaya	50,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,55%	0,00%
	Eletrogaya	50,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
SE	SPOA	25,0%	9%	28%	0%	0%	14%	4%			
	AEGE	25,0%	9%	28%	0%	0%	14%	4%	17%	25,35%	4,37%
	AESA	25,0%	27%	44%	10%	10%	27%	7%			
		25,0%	11%	28%	0%	0%	14%	4%			
SGM	Pequena Mineração	50,0%	11%	30%	0%	0%	15%	8%	12%	49,14%	5,77%
	Reestruturação da SGM	50,0%	17%	17%	0%	0%	9%	4%			
SPE	Usina Plataforma	34,0%	18%	83%	25%	75%	79%	27%			
	Levantamento do Potencial de Energia Eólica	33,0%	11%	30%	0%	0%	15%	5%	65%	23,96%	15,51%
	Ativos de Geração e Transmissão	33,0%					100%	33%			
Totais		11									
IDC total										25,66%	
VPC/VPP										16,86%	
IDCoex										4,32%	

**Quadro 3 – Metas para as atividades, subprojetos e ANEEL – 1/2015**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2015		Avanço de valor 1/2015		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Consultoria	Custos de Interrupções	100,0%	9%	28%	0%	0%	14%	14%	14%	100,00%	14,00%
Totais		1									
IDC total										14,00%	
VPC/VPP										0,59%	
IDCoex										0,08%	

**Quadro 4 – Metas para as atividades, subprojetos e CPRM – 1/2015**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2015		Avanço de valor 1/2015		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Equipamentos	GPR/Sismógrafo	50,0%	11%	30%	0%	0%	15%	8%	15%	100,00%	15,00%
	Eletrorresistivímetro/Eletromagnético	50,0%	30%	30%	0%	0%	15%	8%			
Totais		2									
IDC total										15,00%	
VPC/VPP										3,24%	
IDCoex										0,49%	

**Quadro 5 – Metas para as atividades, subprojetos e EPE – 1/2015**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2015		Avanço de valor 1/2015		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Consultorias	Consumo Serviços	33,3%	26%	100%	70%	100%	100%	33%			
	Eficiência Energética	33,3%	9%	28%	0%	0%	14%	5%	43%	100,00%	42,66%
	Mercado Gás	33,3%	9%	28%	0%	0%	14%	5%			
Totais		3									
IDC total										42,66%	
VPC/VPP										4,33%	
IDCoex										1,85%	

**Quadro 6 – Metas para as atividades, subprojetos e CEPEL – 1/2015**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2015		Avanço de valor 1/2015		Indicadores					
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC	
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada						
Longdist	Roletes	0,5%					100%	1%				
	Uatcef	20,0%	44%	83%	0%	90%	86%	17%				
	Pórticos	Civil	61%	80%	67%	67%	73%	26%	72%	59,60%	42,97%	
		Estrutura	40,0%	41%	60%	61%	61%	61%	24%			
	Yokes	4,5%					100%	5%				
Labcin	Clusters	100,00%					100%	100%	100%	6,54%	6,54%	
Labpmu	1	20,0%			0%	100%	100%	20%				
	2	10,0%			0%	100%	100%	10%				
	3	20,0%			0%	100%	100%	20%	58%	3,10%	1,78%	
	4	30,0%	13%	30%	0%	0%	15%	5%				
	5	20,0%	13%	30%	0%	0%	15%	3%				
Consultorias	Consgrid	60,0%	11%	28%	0%	0%	14%	8%	14%	3,35%	0,48%	
	Muddlima	40,0%	13%	30%	0%	0%	15%	6%				
Recapacitação	Trafos	60,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
	Seadri	Cubículo	20,0%	19%	38%	20%	20%	29%	6%	12%	27,41%	3,19%
		Seccionadores	20,0%	19%	38%	20%	20%	29%	6%			
Totais		9										
IDC total	54,96%											
VPC/VPP	62,20%											
IDCoex	34,18%											

**Quadro 7 – Metas para as atividades, subprojetos e ONS – 1/2015**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2015		Avanço de valor 1/2015		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Equipamento	SMSF	100,0%	13%	30%	0%	0%	15%	15%	15%	100,00%	15,00%
Totais		1									
IDC total											
VPC/VPP											
IDCoex											

## METAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2015

**Quadro 8 – Metas para as atividades, subprojetos e MME – 2/2015**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 2/2015		Avanço de valor 2/2015		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
GM	Minerogaya	50,00%	17%	17%	0%	0%	9%	4%	9%	1,55%	0,13%
	Eletrogaya	50,00%	17%	17%	0%	0%	9%	4%	9%	1,55%	0,13%
SE	SPOA	25,0%	22%	50%	35%	35%	43%	11%	47%	25,35%	11,80%
	AEGE	25,0%	20%	48%	30%	30%	39%	10%	47%	25,35%	11,80%
	AESA	25,0%	28%	72%	40%	50%	61%	15%	47%	25,35%	11,80%
	Desenvolvimento Regional Sustentável	25,0%	25%	53%	35%	35%	44%	11%	47%	25,35%	11,80%
SGM	Pequena Mineração	50,0%	9%	39%	10%	10%	24%	12%	20%	49,14%	9,68%
	Reestruturação da SGM	50,0%	13%	30%	0%	0%	15%	8%	20%	49,14%	9,68%
SPE	Usina Plataforma	34,0%	18%	100%	25%	100%	100%	34%	80%	23,96%	19,14%
	Levantamento do Potencial de Energia Eólica	33,0%	23%	53%	25%	25%	39%	13%	80%	23,96%	19,14%
	Ativos de Geração e Transmissão	33,0%					100%	33%	80%	23,96%	19,14%
Totais		11									
IDC total											40,61%
VPC/VPP											16,86%
IDCoex											6,85%

**Quadro 9 – Metas para as atividades, subprojetos e ANEEL – 2/2015**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 2/2015		Avanço de valor 2/2015		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Consultoria	Custos de Interrupções	100,0%	30%	58%	30%	30%	44%	44%	44%	100,00%	44,00%
Totais		1									
IDC total											44,00%
VPC/VPP											0,59%
IDCoex											0,26%

**Quadro 10 – Metas para as atividades, subprojetos e CPRM – 2/2015**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 2/2015		Avanço de valor 2/2015		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Equipamentos	GPR/Sismógrafo	50,0%	70%	100%	100%	100%	100%	50%	77%	100,00%	77,39%
	Eletroresistivímetro/Eletromagnético	50,0%	35%	65%	45%	45%	55%	27%	77%	100,00%	77,39%
Totais		2									
IDC total											77,39%
VPC/VPP											3,24%
IDCoex											2,51%

**Quadro 11 – Metas para as atividades, subprojetos e EPE – 2/2015**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 2/2015		Avanço de valor 2/2015		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Consultorias	Consumo Serviços	33,3%	0%	100%	0%	100%	100%	33%	69%	100,00%	69,00%
	Eficiência Energética	33,3%	38%	66%	40%	40%	53%	18%	69%	100,00%	69,00%
	Mercado Gás	33,3%	30%	58%	50%	50%	54%	18%	69%	100,00%	69,00%
Totais		3									
IDC total											69,00%
VPC/VPP											4,33%
IDCoex											2,99%

**Quadro 12 – Metas para as atividades, subprojetos e CEPEL – 2/2015**

Subprojeto	Atividades		% de Relevância	Avanço físico 2/2015		Avanço de valor 2/2015		Indicadores				
				Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
				Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Longdist	Roletes		0,5%					100%	1%			
	Pórticos	Uatcef	20,0%	18%	100%	10%	100%	100%	20%			
		Civil	35,0%	21%	100%	33%	100%	100%	35%	100%	59,60%	59,60%
		Estrutura	40,0%	40%	100%	39%	100%	100%	40%			
	Yokes		4,5%					100%	5%			
Labcin	Clusters		100,00%					100%	100%	100%	6,54%	6,54%
Labpmu	1		20,0%			0%		100%	100%	20%		
	2		10,0%			0%		100%	100%	10%		
	3		20,0%			0%		100%	20%	98%	3,10%	3,02%
	4		30,0%	70%	100%	90%	90%	95%	29%			
	5		20,0%	70%	100%	90%	90%	95%	19%			
Consultorias	Consgrid		60,0%	30%	58%	30%	30%	44%	26%			
	Mudclima		40,0%	0%	30%	0%	0%	15%	6%	32%	3,35%	1,08%
Recapacitação	Trafos		60,0%	17%	17%	0%	0%	9%	5%			
	Seadri	Cubículo	20,0%	62%	100%	80%	100%	100%	20%	45%	27,41%	12,36%
		Seccionadores	20,0%	62%	100%	80%	100%	100%	20%			
Totais			9									
IDC total		82,61%										
VPC/VPP		62,20%										
IDCoex		51,38%										

**Quadro 13 – Metas para as atividades, subprojetos e ONS – 2/2015**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 2/2015		Avanço de valor 2/2015		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Equipamento	SMSF	100,0%	42%	72%	33%	33%	53%	53%	53%	100,00%	52,65%
Totais		1									
IDC total											52,65%
VPC/VPP											12,79%
IDCoex											6,73%

## METAS PARA O 1º SEMESTRE DE 2016

**Quadro 14 – Metas para as atividades, subprojetos e MME – 1/2016**

Subprojeto	Atividades		% de Relevância	Avanço físico 1/2016		Avanço de valor 1/2016		Indicadores				
				Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
				Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
GM	Minerogaya		50,00%	11%	28%	0%	0%	14%	7%	14%	1,55%	0,22%
	Eletrogaya		50,00%	11%	28%	0%	0%	14%	7%			
SE	SPOA	Capacita Planejamento Estratégico Marco Conceitual Desenvolvimento Regional Sustentável	25,0%	20%	70%	40%	75%	73%	18%	90%	25,35%	22,77%
	AEGE		25,0%	53%	100%	70%	100%	100%	25%			
	AESA		25,0%	28%	100%	50%	100%	100%	25%			
			25,0%	36%	89%	50%	85%	87%	22%			
SGM	Pequena Mineração		50,0%	26%	65%	30%	40%	53%	26%	54%	49,14%	26,54%
	Reestruturação da SGM		50,0%	35%	65%	46%	46%	56%	28%			
SPE	Usina Plataforma		34,0%	0%	100%	0%	100%	100%	34%	92%	23,96%	22,06%
	Levantamento do Potencial de Energia Eólica		33,0%	24%	77%	50%	75%	76%	25%			
	Ativos de Geração e Transmissão		33,0%					100%	33%			
Totais 11												
IDC total		71,37%										
VPC/VPP		16,86%										
IDCoex		12,03%										

**Quadro 15 – Metas para as atividades, subprojetos e ANEEL – 1/2016**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2016		Avanço de valor 1/2016		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Consultoria	Custos de Interrupções	100,0%	42%	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Totais		1									
IDC total										100,00%	
VPC/VPP										0,59%	
IDCoex										0,59%	

**Quadro 16 – Metas para as atividades, subprojetos e CPRM – 1/2016**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2016		Avanço de valor 1/2016		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Equipamentos	GPR/Sismógrafo	50,0%	0%	100%	0%	100%	100%	50%	100%	100,00%	100,00%
	Eletroresistivímetro/Eletromagnético	50,0%	35%	100%	55%	100%	100%	50%			
Totais		2									
IDC total										100,00%	
VPC/VPP										3,24%	
IDCoex										3,24%	

**Quadro 17 – Metas para as atividades, subprojetos e EPE – 1/2016**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2016		Avanço de valor 1/2016		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Consultorias	Consumo Serviços	33,3%	0%	100%	0%	100%	100%	33%	100%	100,00%	100,00%
	Eficiência Energética	33,3%	34%	100%	60%	100%	100%	33%			
	Mercado Gás	33,3%	42%	100%	50%	100%	100%	33%			
Totais		3									
IDC total										100,00%	
VPC/VPP										4,33%	
IDCoex										4,33%	

**Quadro 18 – Metas para as atividades, subprojetos e CEPEL – 1/2016**

Subprojeto	Atividades		% de Relevância	Avanço físico 1/2016		Avanço de valor 1/2016		Indicadores				
				Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
				Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Longdist	Roletes		0,5%					100%	1%	100%	59,60%	59,60%
	Uatcef		20,0%	0%	100%	0%	100%	100%	20%			
	Pórticos	Civil	35,0%	0%	100%	0%	100%	100%	35%			
		Estrutura	40,0%	0%	100%	0%	100%	100%	40%			
	Yokes		4,5%					100%	5%			
Labcin	Clusters		100,00%					100%	100%	100%	6,54%	6,54%
Labpmu	1		20,0%			0% 100%		100%	20%	100%	3,10%	3,10%
	2		10,0%			0% 100%		100%	10%			
	3		20,0%			0% 100%		100%	20%			
	4		30,0%	0%	100%	10%	100%	100%	30%			
	5		20,0%	0%	100%	10%	100%	100%	20%			
Consultorias	Consgrid		60,0%	42%	100%	70%	100%	100%	60%	100%	3,35%	3,35%
	Muddlima		40,0%	70%	100%	100%	100%	100%	40%			
Recapitação	Trafos		60,0%	13%	30%	90%	90%	60%	36%	76%	27,41%	20,83%
	Seadri	Cubículo	20,0%	0%	100%	0%	100%	100%	20%			
		Seccionadores	20,0%	0%	100%	0%	100%	100%	20%			
Totais 9												
IDC total		93,42%										
VPC/VPP		62,20%										
IDCoex		58,11%										

**Quadro 19 – Metas para as atividades, subprojetos e ONS – 1/2016**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2016		Avanço de valor 1/2016		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Equipamento	SMSF	100,0%	28%	100%	67%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Totais		1									
IDC total										100,00%	
VPC/VPP										12,79%	
IDCoex										12,79%	



## METAS PARA O 1º SEMESTRE DE 2016\*

\* Metas atualizadas após a 1ª prorrogação do Projeto META.

**Quadro 20 – Metas para as atividades, subprojetos e MME – 1/2016\***

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2016		Avanço de valor 1/2016		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
GM	Minerogaya	50,00%	2%	19%	0%	0%	10%	5%	10%	2,45%	0,23%
	Eletrogaya	50,00%	2%	19%	0%	0%	10%	5%			
SE	SPOA	25,0%	20%	70%	35%	35%	53%	13%			
	AEGE	25,0%	11%	30%	0%	0%	15%	4%	23%	28,25%	6,50%
	AESA	Marco Conceitual	0%	19%	0%	0%	10%	2%			
		Desenvolvimento Regional Sustentável	11%	30%	0%	0%	15%	4%			
SGM	Pequena Mineração	100,0%	11%	39%	15%	15%	27%	27%	27%	46,49%	12,49%
SEE	Balanço Contratual do Mercado de Energia	100,0%	58%	58%	20%	20%	39%	39%	39%	9,01%	3,51%
SPE	Usina Plataforma	50,0%	35%	100%	50%	100%	100%	50%	100%	13,80%	13,80%
	Ativos de Geração e Transmissão	50,0%					100%	50%			
Totais		10									
IDC total										36,54%	
VPC/VPP										14,63%	
IDCoex										5,35%	

**Quadro 21 – Metas para as atividades, subprojetos e ANEEL – 1/2016\***

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2016		Avanço de valor 1/2016		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Consultoria	Custos de Interrupções	100,0%	42%	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Totais		1									
IDC total										100,00%	
VPC/VPP										0,49%	
IDCoex										0,49%	

**Quadro 22 – Metas para as atividades, subprojetos e CPRM – 1/2016\***

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2016		Avanço de valor 1/2016		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Equipamentos	Sismógrafos	33,0%	0%	100%	0%	100%	100%	33%			
	Eletroresistivímetros	33,0%	2%	19%	0%	0%	10%	3%	39%	100,00%	39,03%
	Radares de Penetração de Solo/Conduktivímetros	34,0%	0%	17%	0%	0%	9%	3%			
Totais		3									
IDC total										39,03%	
VPC/VPP										4,30%	
IDCoex										1,68%	

**Quadro 23 – Metas para as atividades, subprojetos e EPE – 1/2016\***

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2016		Avanço de valor 1/2016		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Consultorias	Consumo de Serviços	33,0%					100%	33%			
	Eficiência Energética	33,0%	0%	19%	0%	0%	10%	3%	39%	100,00%	39,37%
	Mercado Gás	34,0%	0%	19%	0%	0%	10%	3%			
Totais		3									
IDC total										39,37%	
VPC/VPP										4,57%	
IDCoex										1,80%	

**Quadro 24 – Metas para as atividades, subprojetos e CEPEL – 1/2016\***

Quadro 24 - Metas para as atividades, subprojetos e CRs de 1/2016												
Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2016		Avanço de valor 1/2016		Indicadores					
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC	
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada						
Longdist	Roletes	0,5%					100%	1%				
	Uatcef	20,0%	0%	100%			100%	20%				
	Pórticos	Civil	35,0%	0%	100%			100%	35%	100%	56,14%	56,14%
		Estrutura	40,0%	0%	100%			100%	40%			
	Yokes	4,5%					100%	5%				
Labcin	Clusters	100,00%					100%	100%	100%	6,18%	6,18%	
Labpmu	1	20,0%					100%	20%				
	2	10,0%					100%	10%				
	3	20,0%					100%	20%	58%	3,30%	1,90%	
	4	30,0%	11%	30%	0%	0%	15%	5%				
	5	20,0%	11%	30%	0%	0%	15%	3%				
Consultorias	Consgrid	60,0%	11%	30%	0%	0%	15%	9%	13%	3,22%	0,41%	
	Mudclima	40,0%	19%	19%	0%	0%	10%	4%				
Recapacitação	Trafos	60,0%	2%	19%	0%	0%	10%	6%				
	Seadri	Cubículo	20,0%	0%	100%			100%	20%	46%	31,16%	14,22%
		Seccionadores	20,0%	0%	100%			100%	20%			
Totais			9									
IDC total		78,85%										
VPC/VPP		61,12%										
IDCoex		48,19%										

**Quadro 25 – Metas para as atividades, subprojetos e ONS – 1/2016\***

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2016		Avanço de valor 1/2016		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Equipamento	SMSF	100,0%	11%	30%	0%	0%	15%	15%	15%	100,00%	15,00%
Totais		1									
IDC total		15,00%									
VPC/VPP		14,90%									
IDCoex		2,23%									

## METAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2016\*

\* Metas atualizadas após a 1ª prorrogação do Projeto META.

**Quadro 26 – Metas para as atividades, subprojetos e MME – 2/2016\***

Subprojeto	Atividades		% de Relevância	Avanço físico 2/2016		Avanço de valor 2/2016		Indicadores				
				Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
				Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
GM	Minerogaya		50,00%	19%	38%	20%	20%	29%	15%	33%	2,45%	0,80%
	Eletrogaya		50,00%	34%	53%	20%	20%	37%	18%			
SE	SPOA	Capacita	25,0%	10%	80%	40%	75%	78%	19%	67%	28,25%	18,94%
	AEGE	Planejamento Estratégico	25,0%	70%	100%	100%	100%	100%	25%			
	AESA	Marco Conceitual	25,0%	39%	58%	30%	30%	44%	11%			
		Desenvolvimento Regional Sustentável	25,0%	23%	53%	40%	40%	47%	12%			
SGM	Pequena Mineração		100,0%	9%	48%	15%	30%	39%	39%	39%	46,49%	18,02%
SEE	Balanço Contratual do Mercado de Energia		100,0%	42%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	9,01%	9,01%
SPE	Usina Plataforma		50,0%	0%	100%	0%	100%	100%	50%	100%	13,80%	13,80%
	Ativos de Geração e Transmissão		50,0%					100%	50%			
Totais		10										
IDC total		60,57%										
VPC/VPP		14,63%										
IDCoex		8,86%										

**Quadro 27 – Metas para as atividades, subprojetos e ANEEL – 2/2016\* (Concluído)**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 2/2016		Avanço de valor 2/2016		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Consultoria	Custos de Interrupções	100,0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Totais		1									
IDC total		100,00%									
VPC/VPP		0,49%									
IDCoex		0,49%									

**Quadro 28 – Metas para as atividades, subprojetos e CPRM – 2/2016\***

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 2/2016		Avanço de valor 2/2016		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Equipamentos	Sismógrafos	33,0%					100%	33%	43%	100,00%	43,05%
	Eletroresistivímetros	33,0%	11%	30%	0%	0%	15%	5%			
	Radares de Penetração de Solo/Conduktivímetros	34,0%	13%	30%	0%	0%	15%	5%			
Totais		3									
IDC total		43,05%									
VPC/VPP		4,30%									
IDCoex		1,85%									

**Quadro 29 – Metas para as atividades, subprojetos e EPE – 2/2016\***

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 2/2016		Avanço de valor 2/2016		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Consultorias	Consumo de Serviços	33,0%					100%	33%	56%	100,00%	56,27%
	Eficiência Energética	33,0%	37%	56%	25%	25%	41%	13%			
	Mercado Gás	34,0%	39%	58%	0%	0%	29%	10%			
Totais		3									
IDC total		56,27%									
VPC/VPP		4,57%									
IDCoex		2,57%									

**Quadro 30 – Metas para as atividades, subprojetos e CEPEL – 2/2016\***

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 2/2016		Avanço de valor 2/2016		Indicadores					
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC	
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada						
Longdist	Roletes	0,5%					100%	1%				
	Uatcef	20,0%					100%	20%				
	Pórticos	Civil	35,0%					100%	35%	100%	56,14%	56,14%
		Estrutura	40,0%					100%	40%			
	Yokes	4,5%					100%	5%				
Labcin	Clusters	100,00%					100%	100%	100%	6,18%	6,18%	
Labpmu	1	20,0%					100%	20%				
	2	10,0%					100%	10%				
	3	20,0%					100%	20%	100%	3,30%	3,30%	
	4	30,0%	70%	100%	100%	100%	100%	30%				
	5	20,0%	70%	100%	100%	100%	100%	20%				
Consultorias	Consgrid	60,0%	42%	72%	50%	50%	61%	37%	43%	3,22%	1,37%	
	Mudclima	40,0%	11%	30%	0%	0%	15%	6%				
Recapacitação	Trafos	60,0%	11%	30%	90%	90%	60%	36%				
	Seadri	Cubículo	20,0%					100%	20%	76%	31,16%	23,66%
		Seccionadores	20,0%					100%	20%			
Totais		9										
IDC total	90,66%											
VPC/VPP	61,12%											
IDCoex	55,41%											

**Quadro 31 – Metas para as atividades, subprojetos e ONS – 2/2016\***

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 2/2016		Avanço de valor 2/2016		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Equipamento	SMSF	100,0%	0%	30%	0%	0%	15%	15%	15%	100,00%	15,00%
Totais		1									
IDC total											15,00%
VPC/VPP											14,90%
IDCoex											2,23%

## METAS PARA O 1º SEMESTRE DE 2017\*

\* Metas atualizadas após a 1ª prorrogação do Projeto META.

**Quadro 32 – Metas para as atividades, subprojetos e MME – 1/2017\***

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2017		Avanço de valor 1/2017		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
GM	Minerogaya Eletrogaya	50,00% 50,00%	62% 47%	100% 100%	80% 80%	100% 100%	100% 100%	50% 50%	100%	2,45%	2,44%
SE	SPOA	Capacita	20%	100%	25%	100%	100%	25%			
	AEGE	Planejamento Estratégico	0%	100%	0%	100%	100%	25%			
	AESA	Marco Conceitual	42%	100%	70%	100%	100%	25%			
		Desenvolvimento Regional Sustentável	47%	100%	60%	100%	100%	25%			
SGM	Pequena Mineração	100,0%	53%	100%	70%	100%	100%	100%	100%	46,49%	46,49%
SEE	Balanço Contratual do Mercado de Energia	100,0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	9,01%	9,01%
SPE	Usina Plataforma Ativos de Geração e Transmissão	50,0% 50,0%	0% 0%	100% 100%	0% 0%	100% 100%	100% 100%	50% 50%	100%	13,80%	13,80%
Totais		10									
IDC total		100,00%									
VPC/VPP		14,63%									
IDCoex		14,63%									

**Quadro 33 – Metas para as atividades, subprojetos e ANEEL – 1/2017\* (concluído)**

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2017		Avanço de valor 1/2017		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Consultoria	Custos de Interrupções	100,0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Totais		1									
IDC total		100,00%									
VPC/VPP		0,49%									
IDCoex		0,49%									

**Quadro 34 – Metas para as atividades, subprojetos e CPRM – 1/2017\***

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2017		Avanço de valor 1/2017		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Equipamentos	Sismógrafos	33,0%					100%	33%			
	Eletroresistivímetros	33,0%	70%	100%	100%	100%	100%	33%	100%	100,00%	100,00%
	Radares de Penetração de Solo/Condutivímetros	34,0%	70%	100%	100%	100%	100%	34%			
Totais		3									
IDC total		100,00%									
VPC/VPP		4,30%									
IDCoex		4,30%									

**Quadro 35 – Metas para as atividades, subprojetos e EPE – 1/2017\***

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2017		Avanço de valor 1/2017		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Consultorias	Consumo de Serviços	33,0%					100%	33%			
	Eficiência Energética	33,0%	44%	100%	75%	100%	100%	33%	100%	100,00%	100,00%
	Mercado Gás	34,0%	42%	100%	100%	100%	100%	34%			
Totais		3									
IDC total		100,00%									
VPC/VPP		4,57%									
IDCoex		4,57%									

**Quadro 36 – Metas para as atividades, subprojetos e CEPEL – 1/2017\***

Quadro 55 - Metas para as atividades, subprojetos e GRUPO 1/2017												
Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2017		Avanço de valor 1/2017		Indicadores					
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC	
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada						
Longdist	Roletes	0,5%					100%	1%				
	Uatcef	20,0%					100%	20%				
	Pórticos	Civil	35,0%					100%	35%	100%	56,14%	56,14%
		Estrutura	40,0%					100%	40%			
	Yokes	4,5%					100%	5%				
Labcin	Clusters	100,00%					100%	100%	100%	6,18%	6,18%	
Labpmu	1	20,0%					100%	20%				
	2	10,0%					100%	10%				
	3	20,0%					100%	20%	100%	3,30%	3,30%	
	4	30,0%	0%	100%			100%	30%				
	5	20,0%	0%	100%			100%	20%				
Consultorias	Consgrid	60,0%	28%	100%	50%	100%	100%	60%	66%	3,22%	2,13%	
	Mudclima	40,0%	0%	30%	0%	0%	15%	6%				
Recapacitação	Trafos	60,0%	0%	30%	0%	90%	60%	36%				
	Seadri	Cubículo	20,0%					100%	20%	76%	31,16%	23,66%
		Seccionadores	20,0%					100%	20%			
Totais		9										
IDC total		91,41%										
VPC/VPP		61,12%										
IDCoex		55.87%										

**Quadro 37 – Metas para as atividades, subprojetos e ONS – 1/2017\***

Subprojeto	Atividades	% de Relevância	Avanço físico 1/2017		Avanço de valor 1/2017		Indicadores				
			Meta		Meta		IDA	IDS	Σ IDS	VPS/VPC	IDC
			Prevista	Acumulada	Prevista	Acumulada					
Equipamento	SMSF	100,0%	0%	30%	10%	10%	20%	20%	20%	100,00%	20,00%
Totais		1									
IDC total											20,00%
VPC/VPP											14,90%
IDCoex											2,98%
